Auditoría técnica integral

Agent Platform Fixed

Arquitectura · código · DevOps · QA · seguridad · IA/RAG · integraciones · UX · operación · licencias

NO-GO — CRITICAL RISK

30	5	31	67 %	40–60
DEFECTOS	P0 / STOP-SHIP	TESTS BACKEND	COBERTURA LOCAL	PERSONA-DÍAS

El proyecto no debe exponerse a clientes ni procesar pedidos reales. La evidencia disponible demuestra riesgos de integridad comercial, ausencia de integraciones end-to-end y recuperación no validada.

Contenido

1. Portada
2. Resumen ejecutivo
3. Alcance
4. Exclusiones
5. Metodología
6. Entorno
7. Versión y commit
8. Arquitectura actual
9. Arquitectura recomendada
10. Inventario
11. Estado de servicios
12. Estado de capacidades
13. Calidad de código
14. Calidad de tests
15. Integraciones
16. MVP de Ofideep
17. Seguridad
18. Rendimiento
19. Escalabilidad
20. RAG
21. Modelos
22. UX
23. Operación
24. Backups
25. Recuperación
26. Actualizaciones
27. Licencias
28. Preparación comercial
29. Defectos
30. Riesgos
31. Deuda técnica
32. Mejoras recomendadas
33. Roadmap
34. Esfuerzo
35. Decisión final
Tabla maestra

2. Resumen ejecutivo

El código contiene un backend funcional en local, autenticación/RBAC razonables, HMAC compatible con Chatwoot, importación y RAG básico. Se reprodujeron 31 tests con 67 % de cobertura y el portal compila. Esa evidencia no valida el producto real: la suite usa SQLite, demo, mocks/stubs, TF-IDF local y rate limit deshabilitado.

El flujo Ofideep no funciona end-to-end. PrestaShop, GHL, Chatwoot, Activepieces y Ollama no están operativos; además, Bridge/Chatwoot/Activepieces no tienen ruta de red por defecto. Chatwoot entra en restart loop por PID obsoleto y Nginx no crea workers por una capability ausente. El puerto 9000 pertenece a otro stack fuera de alcance y el proxy de este proyecto no quedó publicado.

Existen cinco stop-ship técnicos:

1. 100 productos demo entran en la búsqueda “verificada”.
2. `no acepto` puede confirmar un pedido, reserva y borrador.
3. La cotización ignora variantes, precios específicos e impuesto real.
4. El stock se reserva solo localmente, sin autoridad PrestaShop ni ciclo de vida.
5. La migración de downgrade ejecuta `drop_all`.

El build limpio solicitado se canceló correctamente al superar 95 % de RAM. El stack auditado quedó detenido para proteger el host; los volúmenes se conservaron. Se estima 40–60 persona-días para alcanzar un candidato a piloto controlado, sujeto a sandboxes, credenciales ficticias, host limpio y revisión legal.

3. Alcance

- Código propio completo: Bridge, Portal, infraestructura, scripts, migraciones y tests.
- Runtime Docker y datos del proyecto `agent-platform-fixed` sin PII.
- Vendor focalizado: README, licencia, Dockerfile, manifiestos, APIs/webhooks usados y código Chatwoot necesario para verificar firmas.
- Toolchain, composición, dependencias, tests, cobertura, build, seguridad, arquitectura, operación, DR, UX y comercialización.
- Documentación previa contrastada con código/runtime.

4. Exclusiones

- No se leyó vendor completo, node_modules, binarios, caches, backups ni logs históricos completos.
- No hubo pruebas ofensivas externas, datos reales, envío a GHL/PrestaShop o operaciones destructivas.
- DAST, escaneo de imágenes, SBOM final, carga y Playwright quedaron BLOCKED por RAM/runtime.
- No se declara asesoramiento legal, certificación, SLA, RPO/RTO o benchmark no medido.

5. Metodología

Se aplicó una cadena de evidencia: lectura → configuración efectiva → análisis estático → test local → runtime → integración → e2e. Una capacidad solo recibe `VERIFIED` cuando su prueba real fue reproducible. Se usaron exclusivamente los estados solicitados. Se sanitizaron variables y se extrajeron solo logs relevantes. Al superar RAM 90 %, se canceló trabajo pesado.

Informes de fase: `docs/audit/01_BASELINE.md` a `docs/audit/22_30_60_90_DAY_PLAN.md`.


6. Entorno

Elemento	Evidencia
SO	Windows 11 Pro build 26200
CPU/GPU	Intel Core Ultra 9 275HX, 24 lógicos; Intel Graphics + RTX 5070 Laptop
RAM	31,46 GiB; 81,2 % usada pre-build; 95,3 % durante build
Disco	C: 925,14 GiB; 161,38 GiB libres en baseline
Docker	29.5.3, overlayfs, 24 CPU/15,35 GiB asignados
Compose	5.1.4
Python/Node/npm/pnpm	3.11.7 / 24.13.0 / 11.6.2 / 10.33.2

7. Versión y commit


- Workspace Git: BLOCKED; no existe `.git`, por lo que rama, commit, tags, diff y submódulos son desconocidos.
- Bridge `pyproject`: 0.9.1; dashboard runtime: `0.9.1-security-remediation` hardcoded.
- Vendor declarado: FlowWink `0cd4e9...`, Chatwoot `b05f22...`/4.16.2, Activepieces `44143d...`/0.86.3.
- Los hashes existen en GitHub y 11/12 archivos representativos coinciden tras normalizar CRLF. Dockerfile Chatwoot tiene un fallback temporal local no declarado. Sin Git no se prueba limpieza integral.

8. Arquitectura actual

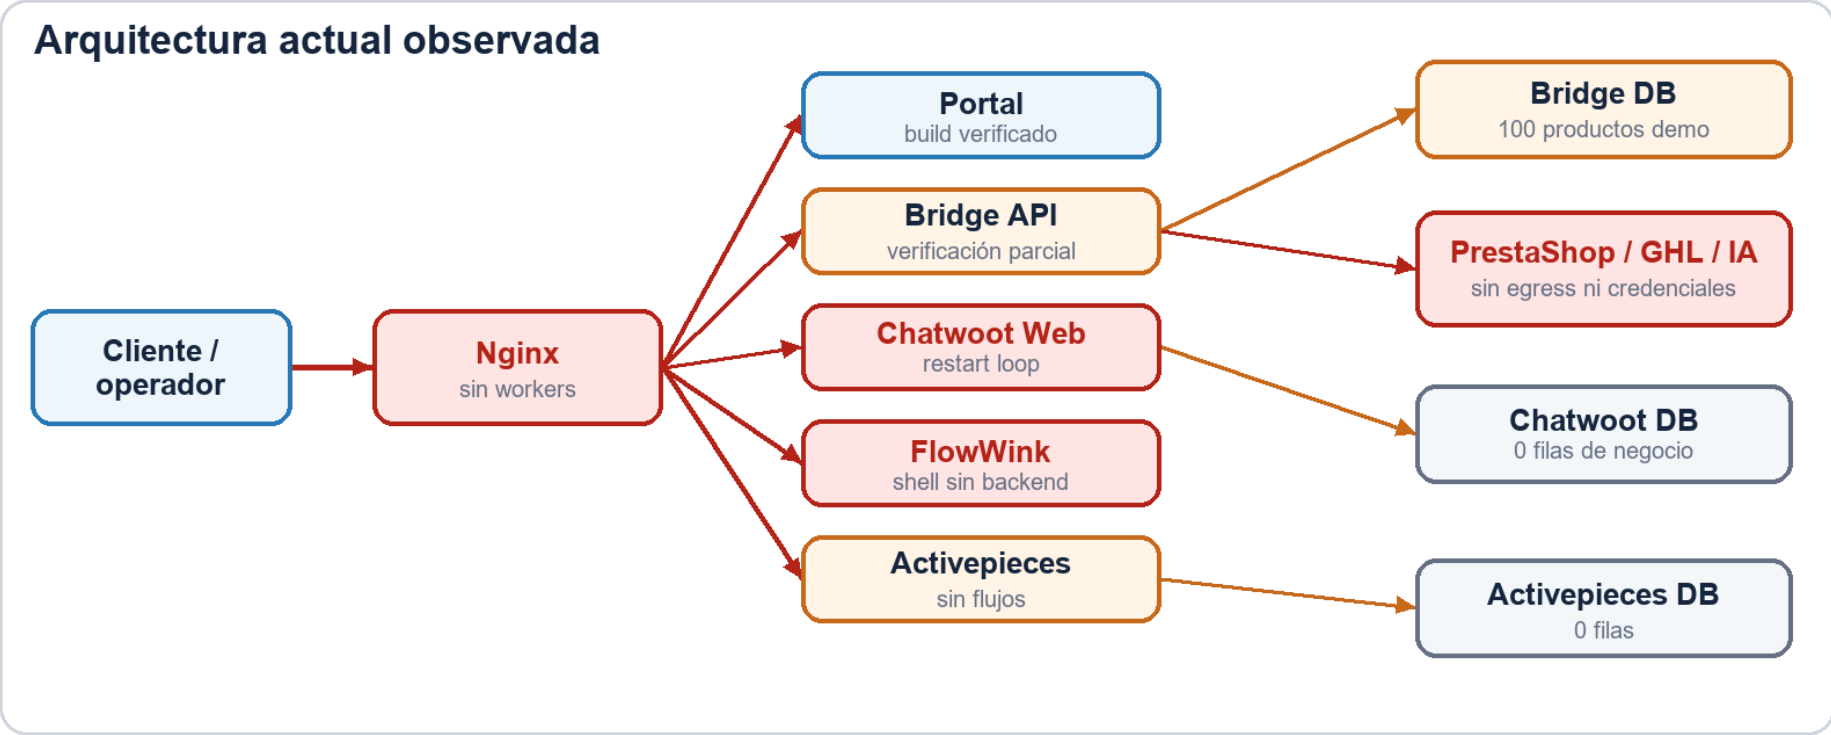

El diseño pretende multi-instance single-tenant. DB/red/volumen por proyecto sí aíslan, pero actualización, restore, eliminación y prueba negativa cruzada no están verificados. Bridge es monolito/SPOF y replica dominios de PrestaShop/GHL/Chatwoot.

9. Arquitectura recomendada

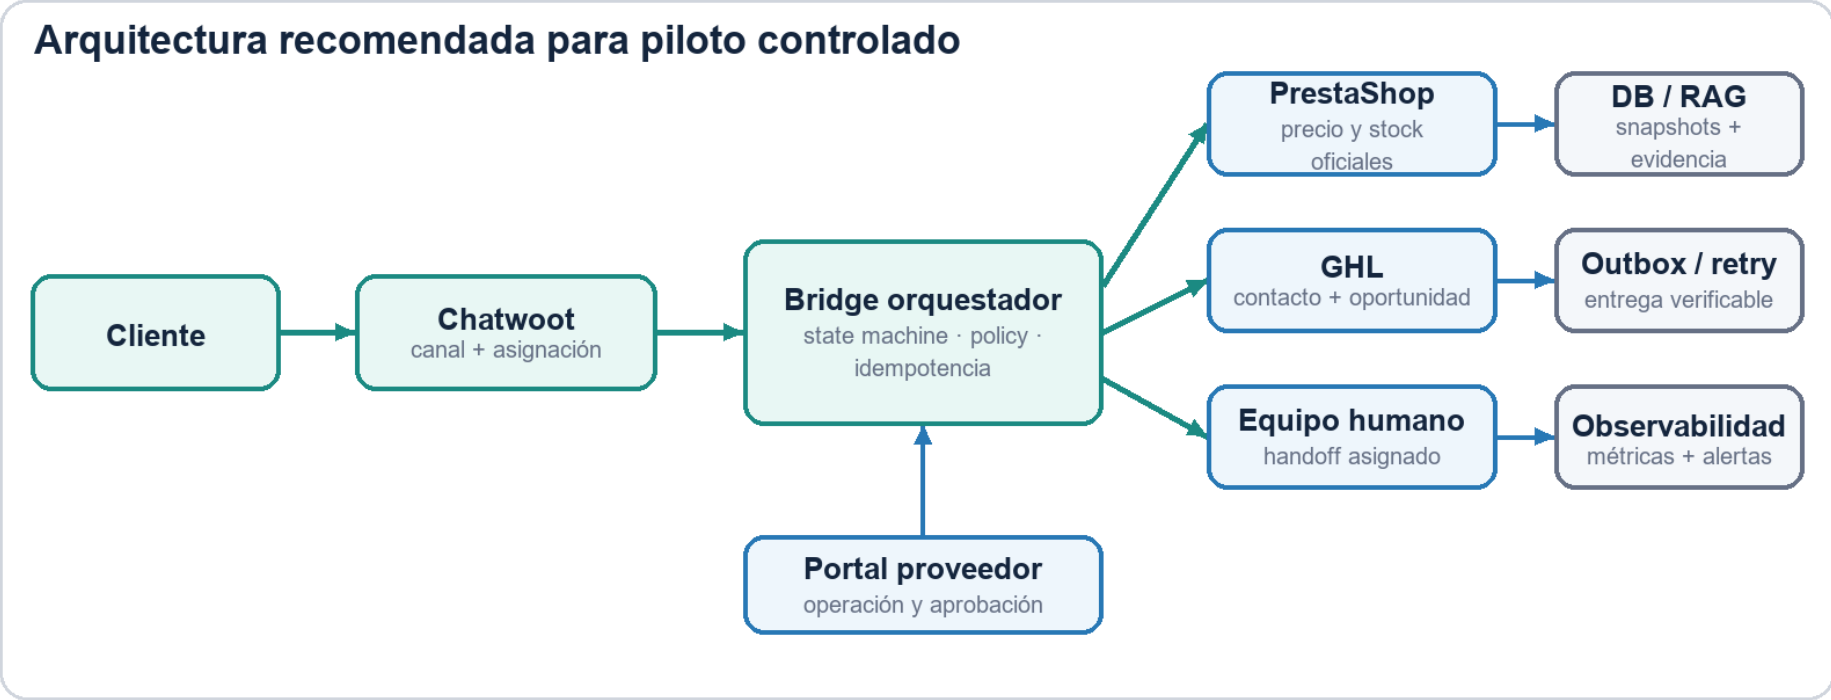

Retirar FlowWink y Activepieces del MVP; hacer PrestaShop autoridad de producto/precio/stock/pedido; usar outbox/idempotencia, egress allowlisted y releases inmutables.

10. Inventario

Compose declara 14 servicios, 3 redes y 9 volúmenes. Código propio: FastAPI/Python y React/TypeScript. Datos: tres PostgreSQL, tres Redis/cache y uploads. Integraciones: PrestaShop, GHL, Chatwoot, Activepieces, Ollama/cloud LLM. RAG: pgvector/TF-IDF/OCR. Inventario detallado: `02_COMPONENT_INVENTORY.md`.

11. Estado de servicios

Servicio	Estado	Evidencia funcional observada
Proxy	BROKEN	Master sin workers, health leak y sin publicación efectiva
Portal	PARTIALLY VERIFIED	Build y upstream estático; UX runtime bloqueada
Bridge	PARTIALLY VERIFIED	Health, ready, login, dashboard y DB reales
Bridge DB	VERIFIED	1 usuario, 25 clientes demo y 100 productos demo consultados
Bridge Redis	CONFIGURED ONLY	Healthy, sin flujo funcional verificado
FlowWink	BROKEN	SPA servida sin Supabase operativo
Chatwoot Web	BROKEN	PID obsoleto y restart loop
Chatwoot Worker	PARTIALLY VERIFIED	Arranque observado, sin conversación e2e
Chatwoot DB	VERIFIED	Esquema y recuentos consultados; sin filas de negocio
Chatwoot Redis	CONFIGURED ONLY	Healthy, sin flujo funcional verificado
Activepieces App	CONFIGURED ONLY	Healthy, sin proyectos ni flujos
Activepieces Worker	BROKEN	Errores RPC/polling y sin ejecución real
Activepieces DB	VERIFIED	79 tablas y cero filas consultadas
Activepieces Redis	CONFIGURED ONLY	Healthy, sin flujo funcional verificado

Al cierre, todos los contenedores del proyecto están detenidos por seguridad de memoria; esto no borró volúmenes.

12. Estado de capacidades

Autenticación es la única capacidad transversal `VERIFIED`. Productos, stock, pedidos, reservas, conversaciones, agentes, automatización y costes están `BROKEN`. Categorías, factura real, SEO, exportación, monitorización, alertas y data lifecycle están `NOT IMPLEMENTED`. Matriz completa: `08_CAPABILITY_MATRIX.md`.

13. Calidad de código

- Ruff: 297; Black: 21 archivos; MyPy: 71 errores; Prettier: 5 archivos; ESLint sin config.
- TypeScript y build Portal pasan.
- Bandit: 0 altas/medias, 2 bajas.
- `main.py` 1.192 líneas; agents/rate limit en memoria; adapters sin resiliencia; migración destructiva.
- Python sin lock/hash; imágenes sin digest.

14. Calidad de tests

31/31 pasan con 67 % de cobertura. La suite es reproducible pero local/simulada: SQLite, demo, stubs, mock LLM, TF-IDF y rate limit off. No cubre integración real, proxy, PostgreSQL, concurrencia, restore, update, performance o frontend. El test “solo catálogo verificado” no excluye demo y es falso positivo semántico.

15. Integraciones

- PrestaShop: adapter rico, solo mock; no credencial/egress; datos obtenidos no se aplican correctamente a precio/pedido.
- GHL: payload básico, solo mock; no atomicidad/retry/reconcile.
- Chatwoot: HMAC compatible por revisión vendor; runtime/account/widget inexistentes.
- Activepieces: sin flujos/API key; adapter fabrica ID en 2xx.
- LLM/Ollama: `Network is unreachable`; cloud keys vacías.

16. MVP de Ofideep

BROKEN. No existe el recorrido cliente→agente→PrestaShop→GHL→handoff. El chat es heurístico, puede usar demo, no captura datos posteriores, no hace pedido PrestaShop y no asigna humano. Criterios: `09_OFIDEEP_MVP_GAP_ANALYSIS.md`.

17. Seguridad

SECURITY BASELINE FAILED. Positivos: auth, revocación, RBAC parcial, HMAC, CORS y Bridge nonroot/read-only. Fallos: integridad comercial P0, rate spoofable, staging no usado, TLS incompleto, dependencias vulnerables, vendor root, RAG denylist evadible, coste/kill switch inerte, backup no restaurado, no egress policy utilizable y no observabilidad.

18. Rendimiento

No hubo benchmark. Una instantánea mostró AP app 50,55 % CPU/945,8 MiB, AP Redis 37,08 %, CW worker 38,74 %/499,6 MiB y tráfico AP↔Redis elevado. Puede reflejar loops; no se presenta como steady state. RAG, sync/import y costes contienen patrones O(n)/N+1.

19. Escalabilidad

Una instalación completa ya está rota. 5 clientes implicarían 70 servicios y riesgo alto en un host; 10+ no son factibles con operación manual. 25–100 requieren orquestación, telemetry, releases, capacity/cost model y quizá data plane por cliente con control plane; no se recomienda SaaS compartido sin demanda/aislamiento demostrados.

20. RAG

Ingesta TXT/PDF/DOCX/XLSX/images, OCR, chunks, vectores, citas y ACL están parcialmente implementados. Tests usan TF-IDF, no embeddings reales. Runtime tiene 0 documentos. Carga todos los chunks, ACL por defecto amplia, filtro de secretos por substrings, sin MIME/AV/DLP/reranker/evals.

21. Modelos

Configurados Ollama Qwen 3B/7B y Nomic Embed, pero no accesibles. OpenAI/Anthropic sin key. Coste siempre 0. No se verificaron pesos, versión, licencia, calidad, latencia ni fallback. `/agents/run` no tiene tools ni grounding obligatorio.

22. UX

Build/typecheck pasan y UI visible está en español por código. Tema y breakpoints existen, no se probaron visualmente. Links a cinco módulos ausentes; i18n anuncia muchos más. Branding genérico, datos demo/configuración pueden parecer reales, no frontend tests/axe y 401 no reautentica. Capturas honestamente BLOCKED.

23. Operación

No hay logs centralizados, tracing, dashboards, alertas, SLO, runbooks ensayados, certificate/disk monitor ni queue visibility. Health da falsos positivos. No puede detectarse de forma automática chat sin respuesta, pedido duplicado, backup fallido o coste anómalo.

24. Backups

Scripts incluyen tres dumps y dos volúmenes, checksums y cifrado. Omiten Redis/AP cache/config/TLS/FlowWink externo, no coordinan snapshot y no tienen retención/offsite/alerta. La instancia actual no sigue su convención. Estado `IMPLEMENTED BUT NOT TESTED`.

25. Recuperación

`BLOCKED`: no hubo restore completo, por lo que RPO/RTO son desconocidos. Restore limpia destinos y confía en health defectuoso. Debe probarse en proyecto aislado con hashes, conteos y flujo funcional.

26. Actualizaciones

`BROKEN`: scripts requieren Git ausente y hacen checkout global. No hay registry/digest/firma/canary/matriz de schema. Downgrade puede borrar datos.

27. Licencias

FlowWink MIT. Chatwoot/Activepieces separan rutas EE, que están presentes. El notice “Enterprise excluded” es incorrecto. Código propio no tiene licencia raíz. Modelos/SBOM no inventariados. Fuentes oficiales: licencia Activepieces y repositorio Chatwoot.

28. Preparación comercial

FAILED. No deben venderse como reales: agente tool-calling, catálogo/stock/precio, GHL/chat e2e, facturación, SEO, backup verificado, alertas, SLA o escalabilidad. Faltan ownership legal, NOTICE/SBOM, DPA/retención/export/delete, onboarding probado, soporte y aceptación.

29. Defectos

30 defectos registrados: 5 P0, 21 P1 y 4 P2; no se registraron P3. Registro con raíz, esfuerzo y regresión: `18_DEFECT_REGISTER.md`.

30. Riesgos

Stop-ship: datos comerciales incorrectos, consentimiento, recuperación. Altos: integraciones, duplicados, recursos, RAG, costes, observabilidad, licencias, supply chain, upgrades, aislamiento y privacidad. Registro: `19_RISK_REGISTER.md`.

31. Deuda técnica

Principales: state machine ausente, catálogo incoherente, migración destructiva, adapters sin resiliencia, estado en memoria, supply chain flotante, vendor sprawl, observabilidad, scripts duplicados y documentación manual. No ejecutar refactor big-bang antes de fijar tests P0.

32. Mejoras recomendadas

1. Eliminar demo del plano cliente y fijar ownership PrestaShop.
2. State machine + idempotencia/outbox/locks para comercio y GHL.
3. Stack MVP mínimo: Bridge, Portal, Chatwoot y DB; retirar componentes sin uso.
4. Egress allowlisted, TLS, proxy/health, límites y staging fail-closed.
5. Restore probado, releases inmutables, SBOM y observabilidad.

33. Roadmap

0–7 días: stop-ship, proxy/CW/red/recursos/deps y simplificación. 2–4 semanas: Presta/GHL/chat e2e, DR, observabilidad, QA/UX/legal. 1–3 meses: release platform, RAG seguro, onboarding/aislamiento/cost model. 3–12 meses: HA/regiones/marketplace solo tras demanda. Véase `21_REMEDIATION_ROADMAP.md`.

34. Esfuerzo

- Candidato a piloto: 40–60 persona-días, 4–8 semanas calendario con equipo paralelo.
- Producto repetible: 3–6 persona-meses adicionales.
- No incluye HA/SaaS/marketplace ni espera de terceros. Recalibrar después de medir runtime estable.

35. Decisión final

NO-GO — CRITICAL RISK

La decisión solo puede revisarse cuando no queden P0, PrestaShop/GHL/Chatwoot estén verificados e2e, el backup haya sido restaurado, el stack sobreviva reboot/soak con recursos seguros y seguridad/licencias/privacidad tengan aceptación formal.

Tabla maestra

ID	Área	Capacidad	Estado	Evidencia	Problema	Impacto	Prioridad	Esfuerzo	Solución	Criterio de aceptación
M-01	Repo	Trazabilidad	BLOCKED	Sin `.git`	Commit/diff desconocido	Release no reproducible	P1	M	Restaurar repo/release metadata	SHA/tag verificable
M-02	Datos	Productos	BROKEN	100 demo	Demo como verificado	Oferta falsa	P0	S	Excluir demo	Cero demo en cliente
M-03	Chat	Consentimiento	BROKEN	Substring	Negación confirma	Pedido no autorizado	P0	M	State machine	Matriz adversarial pasa
M-04	Commerce	Precio	BROKEN	Código pricing	Ignora specific/variant/IVA	Importe incorrecto	P0	L	Precio Presta snapshot	Golden contracts
M-05	Commerce	Stock	BROKEN	Reserva local	No autoridad/TTL	Oversell	P0	L	Reserva/pedido Presta	Concurrencia sin oversell
M-06	DB	Migraciones	BROKEN	`drop_all`	Downgrade destructivo	Pérdida datos	P0	M	Migrations explícitas	Fixture preservado
M-07	Network	Egress	BROKEN	Sin default route	APIs inaccesibles	MVP inutilizable	P1	M	Egress allowlist	Solo destinos autorizados
M-08	Proxy	Entrada	BROKEN	setuid/no workers	Capability errónea	Sin acceso	P1	S	Nginx unprivileged	HTTP/health/reboots
M-09	Chatwoot	Web	BROKEN	PID stale	Restart loop	Chat caído	P1	S	Entrypoint robusto	10 reinicios sanos
M-10	Host	Recursos	BLOCKED	RAM 95,3 %	Sin limits/loops	Inestabilidad	P1	M	Límites/capacity	Idle/soak dentro budget
M-11	Auth	Login	VERIFIED	Login runtime/tests	Controles avanzados faltan	Riesgo residual	P2	M	MFA/lock/aud-iss	Security tests
M-12	RBAC	Permisos	PARTIALLY VERIFIED	Tests viewer/admin	Matriz/races	Acceso indebido	P1	M	Policy tests/CAS	Cada ruta/rol validado
M-13	GHL	Lead	BROKEN	Mock/código	Sin creds/egress/idempotencia	Duplicados	P1	L	Outbox/upsert	Fault injection
M-14	Chatwoot	Webhook	IMPLEMENTED BUT NOT TESTED	Firma vendor compatible	Sin account/e2e	Chat sin respuesta	P1	L	Onboarding e2e	Mensaje visible
M-15	Chatwoot	Handoff	BROKEN	Solo status open	No asignación	Lead abandonado	P1	M	Team/agent assignment	Agente humano lo recibe
M-16	Activepieces	Workflows	BROKEN	DB 0/fake ID	Sin flujo real	Automatización falsa	P1	S/M	Retirar o validar	Execution ID/estado real
M-17	FlowWink	Agentes	BROKEN	Supabase vacío	Shell estático	Complejidad/promesa falsa	P1	S	Retirar MVP	No servicio/promesa muerta
M-18	AI	Tool calling	NOT IMPLEMENTED	allowed_tools inerte	LLM libre separado	Alucinación	P1	L	Tool loop allowlist	Evals sin tool bypass
M-19	AI	Costes	BROKEN	Coste siempre 0	Budget inerte	Coste runaway	P1	M	Usage/tarifario/hard limit	Límite se dispara
M-20	RAG	Búsqueda	PARTIALLY VERIFIED	TF-IDF tests	No remote/runtime	Calidad desconocida	P1	L	Evals/embedding real	Recall/latencia umbral
M-21	RAG	Seguridad	BROKEN	Denylist	Exfil evadible	Fuga datos	P1	L	ACL/DLP/policy	Dataset exfil pasa
M-22	Import	Productos/datos	PARTIALLY VERIFIED	Tests local	N+1/no escala/export	Operación manual	P2	M	Batch/upsert/export	10k limitado/roundtrip
M-23	Backup	Copia	IMPLEMENTED BUT NOT TESTED	Scripts	Incompleta/inconsistente	Sin protección demostrada	P1	L	Snapshot/manifiesto	Backup fixture válido
M-24	DR	Restore	BLOCKED	Nunca ejecutado	RPO/RTO desconocidos	Riesgo existencial	P0	L	Restore aislado	Hashes/flujo/RTO medidos
M-25	Release	Update/rollback	BROKEN	Sin Git	Checkout global	No parche seguro	P1	L	Images/digests	Upgrade+rollback por cliente
M-26	Supply	Dependencias	BROKEN	pip/npm audit	Parsers/Vite vulnerables	Seguridad	P1	M	Update/lock/scan	Audits y corpus pasan
M-27	Docker	Contenedores	PARTIALLY VERIFIED	Inspect	Root/no limits/tags	Blast radius	P1	M	Harden/digests	Policy scan pasa
M-28	QA	Backend tests	PARTIALLY VERIFIED	31/31, 67 %	Mocks/falsos positivos	Falsa confianza	P1	L	Test pyramid real	Ruta crítica sin mocks
M-29	QA	Frontend tests	NOT IMPLEMENTED	Sin runner	Regresión/a11y	UX rota	P2	M	Component/E2E/axe	CI pasa viewports
M-30	UX	Navegación	BROKEN	Anchors sin sección	Producto fantasma	Confusión comercial	P2	M	Recortar/implementar	Todo link funcional
M-31	Ops	Health	BROKEN	200 degradado/master vivo	Falso positivo	Incidente invisible	P1	S	Liveness/readiness	Fallos cambian estado/código

ID	Área	Capacidad	Estado	Evidencia	Problema	Impacto	Prioridad	Esfuerzo	Solución	Criterio de aceptación
M-32	Ops	Alertas	NOT IMPLEMENTED	Sin collector	No detección	SLA imposible	P1	L	OTel/metrics/alerts	Fault injection alerta
M-33	Privacy	Lifecycle	NOT IMPLEMENTED	Sin export/delete	Retención/lock-in	Legal	P1	L	Export/erase auditado	Fixture eliminado/exportado
M-34	License	Redistribución	BLOCKED	EE presente/no LICENSE raíz	Derechos inciertos	Bloqueo venta	P1	M	Legal/NOTICE/SBOM	Artefacto aprobado
M-35	Commercial	Piloto	BROKEN	Gaps anteriores	Scope no real	Daño cliente	P0	40–60 d	Roadmap/gates	Todos gates día 90

Documentos de evidencia: `audit/evidence/` Plan 30/60/90: `audit/22_30_60_90_DAY_PLAN.md`
